

轨迹织城

以百年京张为公共创新主轴

区域定链 | 走廊织网 | 重点区落项目

一轴三廊三核，形成开放问题、
自主验证、首用转化、知识回流的创新链；
普通服务不断线，AI应用按需接入。

城市先行 | 公共服务不断线

现场实施须完成场地、权属、责任和专业条件确认

THREE PLACE-BASED PROJECTS

01

众智园 | 可旁观的验证院

公共路径—安全缓冲—受控测试—人工接管

02

AI原点 | 开源修补街

共享前廊—问题门诊—开放工具—受控后室

03

大钟寺 | 首用服务站厅


地面到达—需求服务—人工复核—安静候场

把创新链落到一条街、一个场景和一次可签收的试验。

P01 / L4 + L5 SPATIAL WORKING PLAN

京张AI创新带空间工作总图：真实语境、临时范围、行动接口

以锁定日期的开放底图校核空间关系，以临时几何承载方案任务；二者分层表达，不替代法定规划和工程测绘。

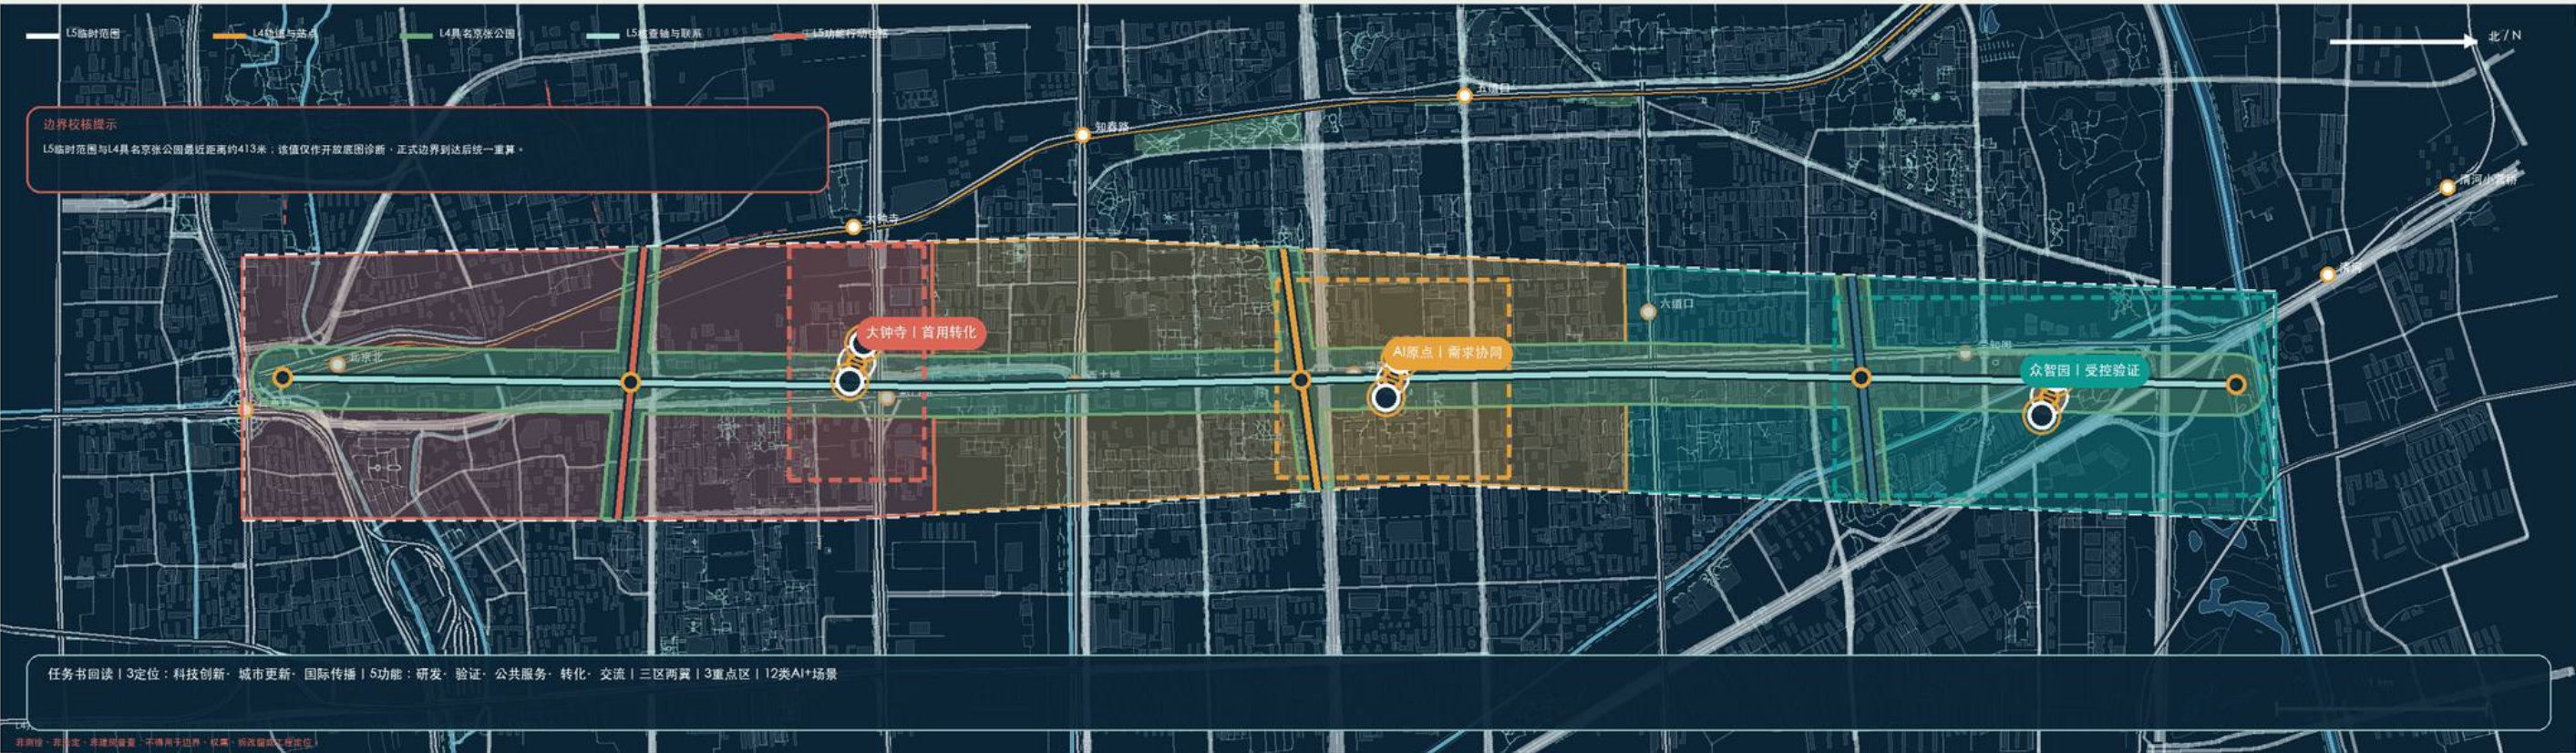

01 北段 | 众智园受控验证

清河界面、公众观察与受控测试分区；取得权利、消防、保险和独立复核后再定位。

L4现状线索 + L5行动建议 | 现场和依法核勘后定位

02 中段 | AI原点需求协同

依托经核勘共享首层，组织高校、社区、园区和人才服务；保留纸质、电话和人工渠道。

L4现状线索 + L5行动建议 | 现场和依法核勘后定位

03 南段 | 大钟寺首用转化

按任务书站点线索对工作窗重定位，仅研究站外地面到达、需求合规和可撤首期组件。

L4现状线索 + L5行动建议 | 现场和依法核勘后定位

P04 / THREE PLACE-BASED PLAN-SECTION-OPERATION PROTOTYPES

三处重点区域：语境总平、空间体验、实施接口与责任验收

每处均以L4开放底图说明真实城市语境，以L5临时几何说明设计任务；概念图不作为现状、建筑、工程或投资证据。

01 众智园

受控验证

L4语境 + L5研究性总平

2A/ID / 1.1 现状底图 / 2.2 研究性总平 / 2.3 研究性总平 / 2.4 研究性总平 / 2.5 研究性总平

L4开放工作底图 | 建筑2026-07-08 | POI 2026-05-06 | 其他图层2026-08-11 | © OpenStreetMap contributors / ODBL 1.0

非测绘、非法定、非建筑审查、不得用于边界、权属、规划或工程定位

AI概念图 / 非现状证据

1 清河—京张界面 | 公众观察与管控测试分隔

2 AN-V21-007 + ZY-AA/BB | 开放、无障碍、隔离与应急待核

3 DC/PC-ZY-001/002 | 可撤、可恢复；权利/消防/保险未闭环即停止

责任与验收

依法任命IE、IV、DC并书面接收；验证结论与运营服务分权。

角色类型 → 依法任命 → 书面接收

尺寸、权利、接口、红线线、建筑现状和工程条件均待正式核验

02 AI原点

需求协同

L4语境 + L5研究性总平

2A/ID / 1.1 现状底图 / 2.2 研究性总平 / 2.3 研究性总平 / 2.4 研究性总平 / 2.5 研究性总平

L4开放工作底图 | 建筑2026-07-08 | POI 2026-05-06 | 其他图层2026-08-11 | © OpenStreetMap contributors / ODBL 1.0

非测绘、非法定、非建筑审查、不得用于边界、权属、规划或工程定位

AI概念图 / 非现状证据

1 高校—社区—园区网络 | 共享背景保留普通人工服务

2 AN-V21-005 + AI-AA/BB | 具体首层、权利、消防和时段待核

3 DC/PC-AI-001/002 | 可移动、可停用；纸质/电话/人工同步可用

责任与验收

依法任命IE、DO、PO并书面接收；拒绝AI不增加费用、无理等待或异地行程。

角色类型 → 依法任命 → 书面接收

尺寸、权利、接口、红线线、建筑现状和工程条件均待正式核验

03 大钟寺

首用转化

L4语境 + L5研究性总平

2A/ID / 1.1 现状底图 / 2.2 研究性总平 / 2.3 研究性总平 / 2.4 研究性总平 / 2.5 研究性总平

L4开放工作底图 | 建筑2026-07-08 | POI 2026-05-06 | 其他图层2026-08-11 | © OpenStreetMap contributors / ODBL 1.0

非测绘、非法定、非建筑审查、不得用于边界、权属、规划或工程定位

AI概念图 / 非现状证据

1 大钟寺站外地面—需求合规接口 | 不依赖地下连接

2 AN-V21-003 + DZ-AA/BB | 按具名站点线索定位、站口和峰值待核

3 DC/PC-DZ-001/002 | 90/180日复核；需求/预算/采购/退出未闭环即停止

责任与验收

依法任命DO、PF、IE并书面接收；续期、整改或退出均留回执。

角色类型 → 依法任命 → 书面接收

尺寸、权利、接口、红线线、建筑现状和工程条件均待正式核验

P01 / DELIVERY LEDGER

项目门控、责任与五年运营账

凡场地、需求、数据、资金、采购、验收、运维或退出责任未明确的项目，不转入下一阶段。



RW-A01

AI原点需求协同室

输入	问题证据包
验收物	需求简报+公众回应
停止条件	需求/权利不清

RW-B01

众智园独立验证实验室

输入	版本+测试任务
验收物	可复现包+独立意见
停止条件	重大风险未闭环

RW-C01

大钟寺首用转化与运营池

输入	需求+验证+全周期成本
验收物	上线清单+后评估
停止条件	采购/OPEX不可承受

S06 | 百日限定实施：四阶段、六个决策窗口

P1 | 0-30日

场地与基线

0-10日核验场地；11-30日巡查路线、普通服务与人工负担

权利、可达或普通服务条件未落实即停止

P2 | 31-60日

成本与封闭检验

31-45日工程量、报价和值守；46-60日影子日志与复原演练

数据越界、人工接管或复原失败即通回

P3 | 61-90日

限定共测

依法依规后限时共测；第90日强制收尾并移交退出证据

未获授权不启动；严重事件立即暂停

P4 | 91-100日

复原与书面决定

撤权、删数、拆机、恢复固定导航与人工服务；形成书面四选一意见

六项退出回执缺一项即不得转段

责任接续：角色占位 → 依法任命 → IE/DO/PO/IV按适用事项书面接收；退出资源逐项取证，不设固定比例。

五年总成本取证 TC5

$C0 + \sum (Ot + Mt + Pt + Vt + At + Rt) + U + X$

G0	工程量与服务量现场核验	待核
G1	真实需求、非AI基线与必要人工	待基线
G4	依法开展价格检索、市场调查或询价	未取价
G4+	预算批准、合同生效或资金实际到位	未落实

10类必要取证：场地 | 设备 | 人员 | 无障碍/普通服务 | 独立验证 | 公众参与 | 保险应急 | 维护 | 更新 | 退出恢复

工程量、单价、责任或范围未核验的条目不计入确定性总额。

P03 / ACCESS, RAIL AND BLUE-GREEN AUDIT

京张公共轴与三条横向联系：九段、八点、六项现场核查

将开放路网、步骑、轨道、站点和水系线索与L5核查任务叠合；彩色线点不表示已开放、达标或工程线位。



逐段六项核查


- 01 开放与围挡
日期、时段、绕行
- 02 连续无障碍
坡度、净宽、台阶、电梯
- 03 步骑与过街
冲突、等待、求助
- 04 铁路与临水
保护、蓝线、防洪
- 05 夜间与应急
照明、巡检、应急到达
- 06 运维与退出
责任、修复、回执

形成经核验收指标的前置条件
现场记录 + 代表性用户复核 + 专业意见 + 责任人签收；此前所有段状态均为未核收。

P02 / PROGRAMME ENVELOPES ON CONTEXT

功能行动包络与可逆组件：在既有城市肌理中门控落位

四类功能仅表达行动任务，六项组件仅表达候选索引；均不改变法定用地，不推定建筑拆改留、开发强度或建设规模。

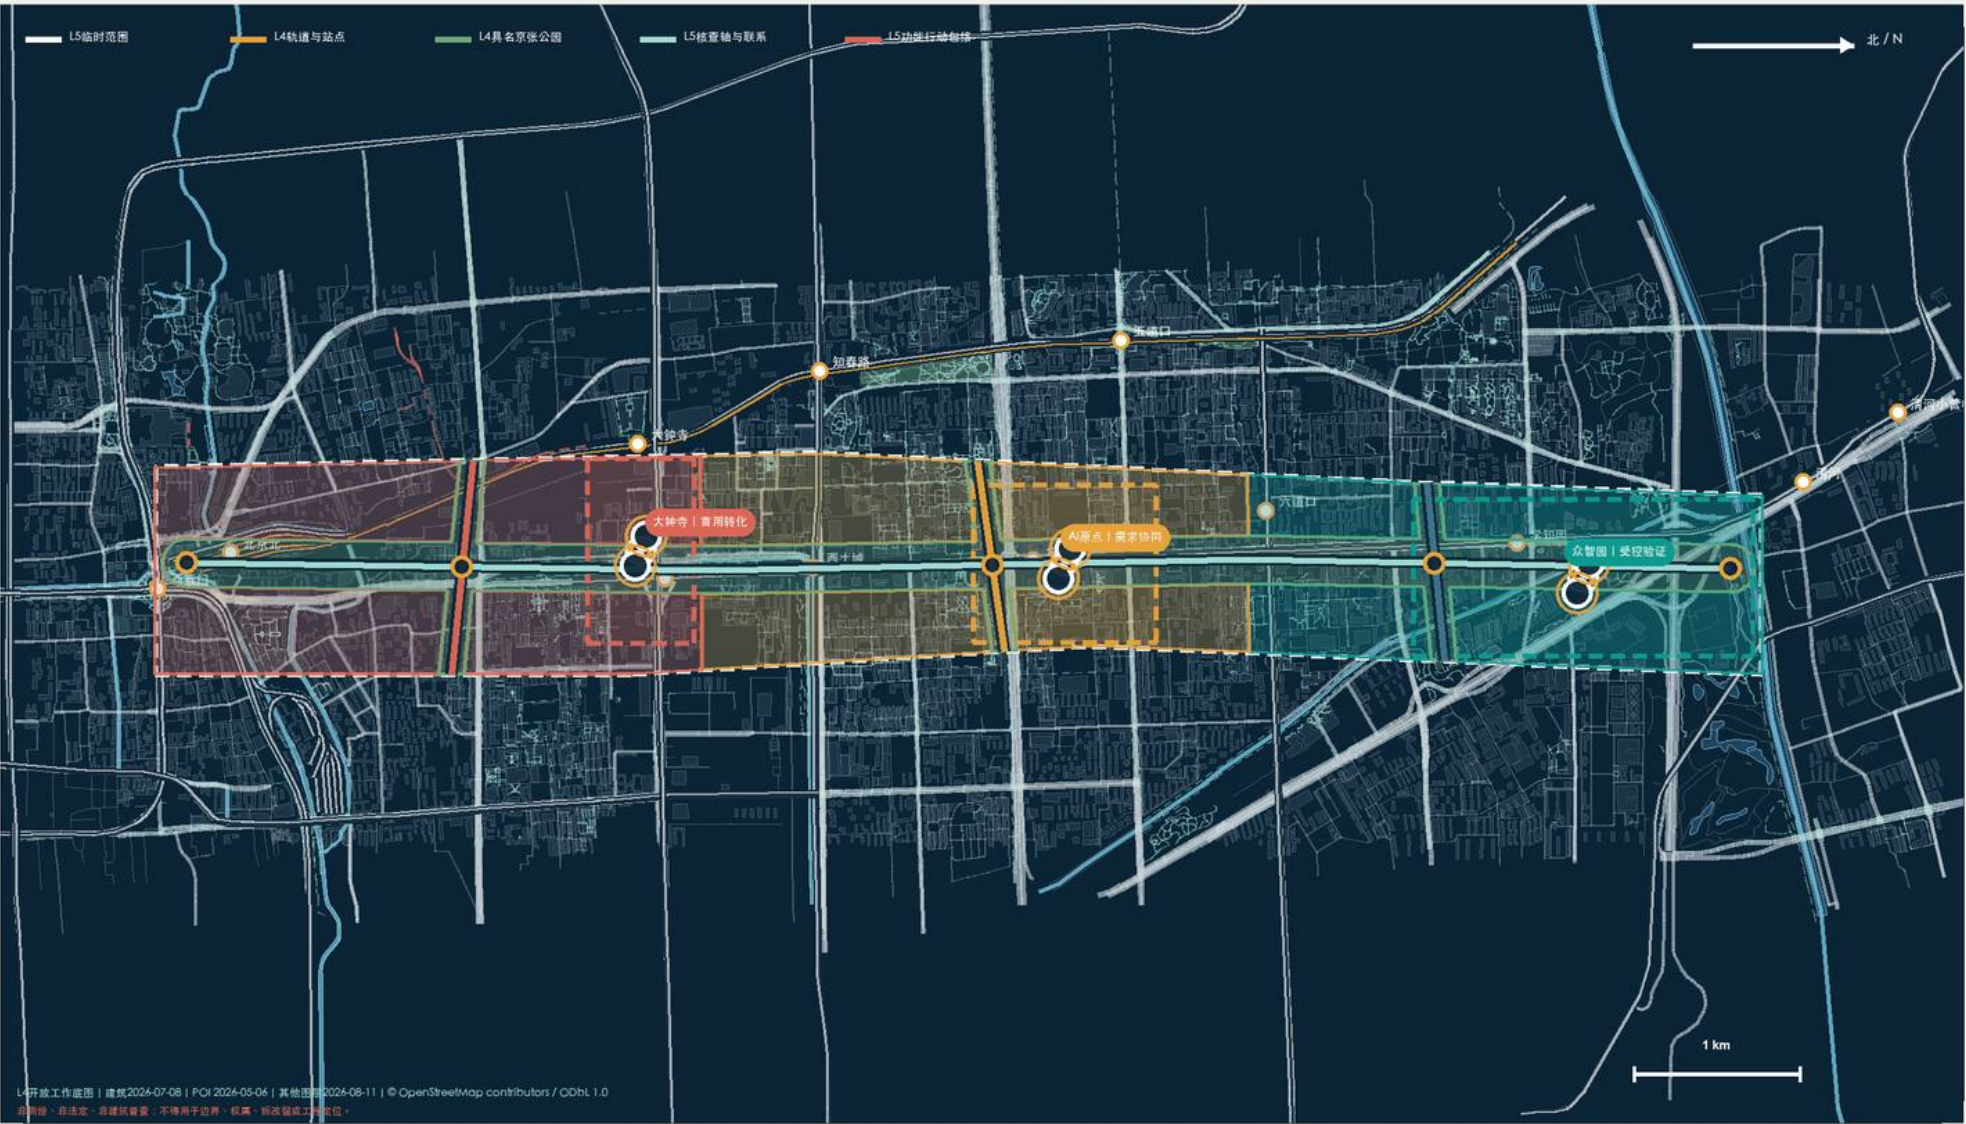

01 开放验证与研发协作

众智圈：公众观察、受控测试、独立结论

L5行动包络 | 正式用地与权利条件待核

02 近校共学与人才服务

AI原点：共享首层、普通服务、分布式协同

L5行动包络 | 正式用地与权利条件待核

03 场景应用与复合服务

大钟寺：真实需求、依法采购、评估退出

L5行动包络 | 正式用地与权利条件待核

04 公共轴与蓝绿联系

九段八点现场核查，未核验前不计连续开放

L5行动包络 | 正式用地与权利条件待核

组件落位顺序


任务 → 研究窗 → 候选组件 → G0场地/权利 → G1需求/公众 → G2受控原型

任一法定或专业条件未闭环，保持可移动、可暂停、可退出。

D01 / OVERALL URBAN DESIGN WORKING PLAN

一轴三廊三核：空间结构与项目闭环同图审查

空间联系、重点区域和项目门控统一编号；图上关系为工作建议，不构成法定道路、河道、用地或建设方案。

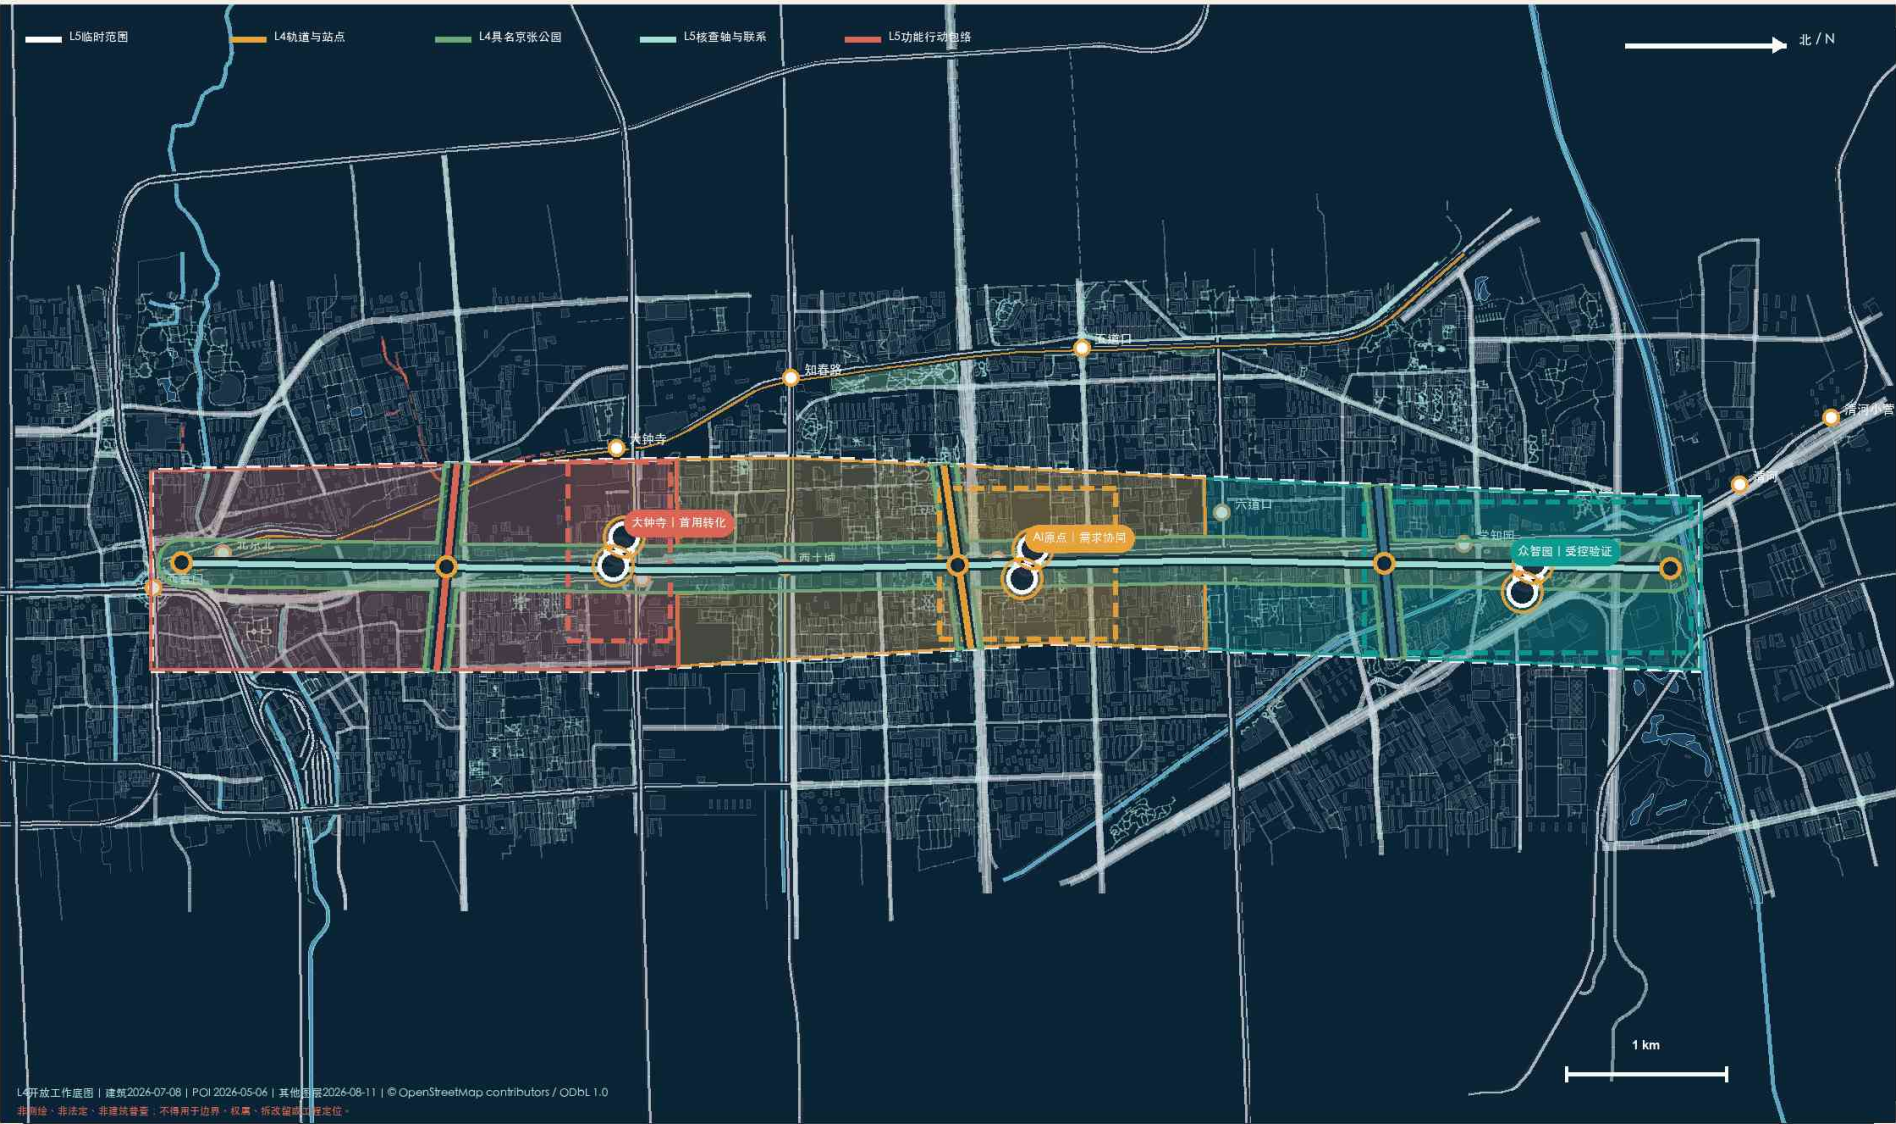

三链项目闭环





任务书对应关系

三大定位	科技创新、城市更新、国际传播
五类功能	研发、验证、公共服务、转化、交流
三区两翼	三核差异化承载、东西向协同输入输出
三处重点区	L4语境图 + L5总平 + AA/BB剖面 + 实施台账
AI+场景	12类场景、双独立门、人工最终复核和退出恢复

C1 / KEY-AREA PLAN-SECTION-OPERATION



众智园 · 受控验证系统

公众观察、半受控验证、受控测试和后勤应急四层分区；优先复用经核室内载体。

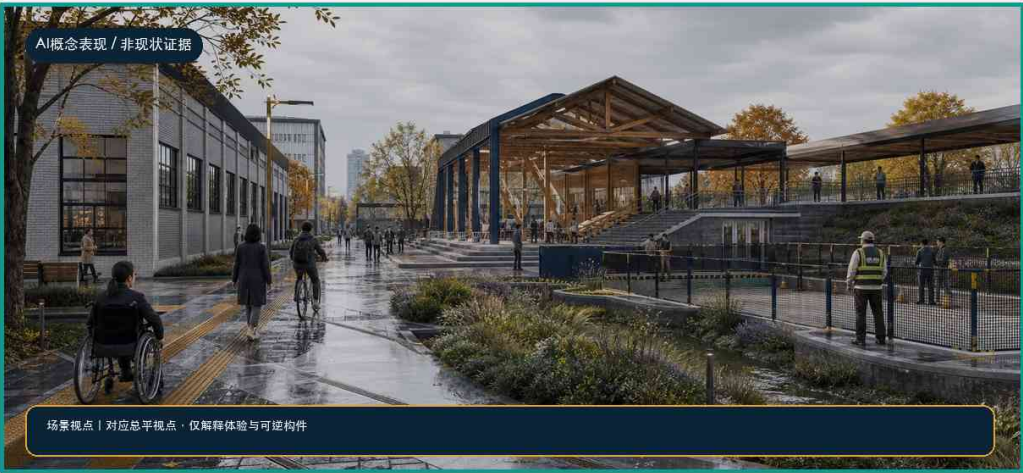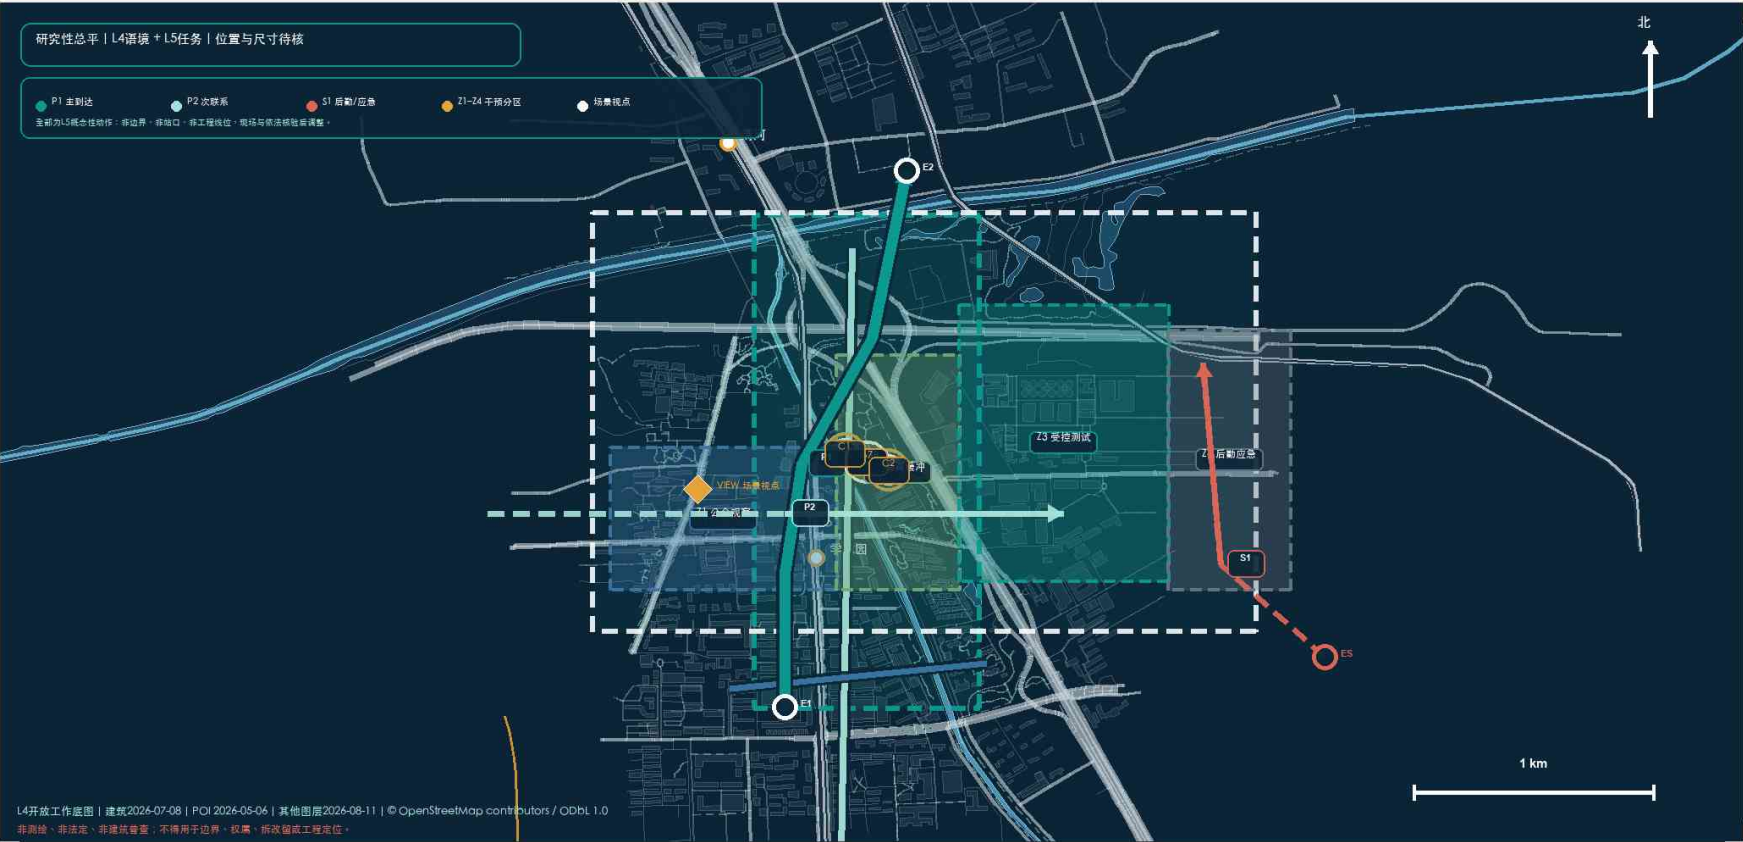

图面对象与审查接口

工作窗	KEY-001
核查锚点	AN-007
剖切线	SEC-ZY-AA / SEC-ZY-BB
首期组件	DC-ZY-001 / DC-ZY-002
总平动作	E1/E2/ES + P1/P2/S1 + Z1-Z4 + VIEW

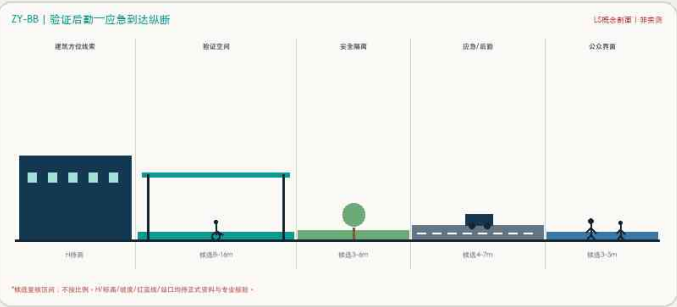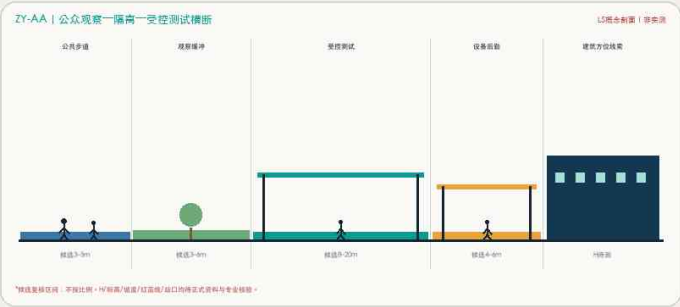

空间—运营—退出闭环




G0至G6逐级留痕：场地、权利、公众、风险、成本、采购或退出任一条件未闭环即保持BLOCK。

C2 / KEY-AREA PLAN-SECTION-OPERATION



AI原点 · 分布式需求协同网络

以一处权属、消防、开放时段明确的共享首层为首期载体，串联社区、高校和人才服务。

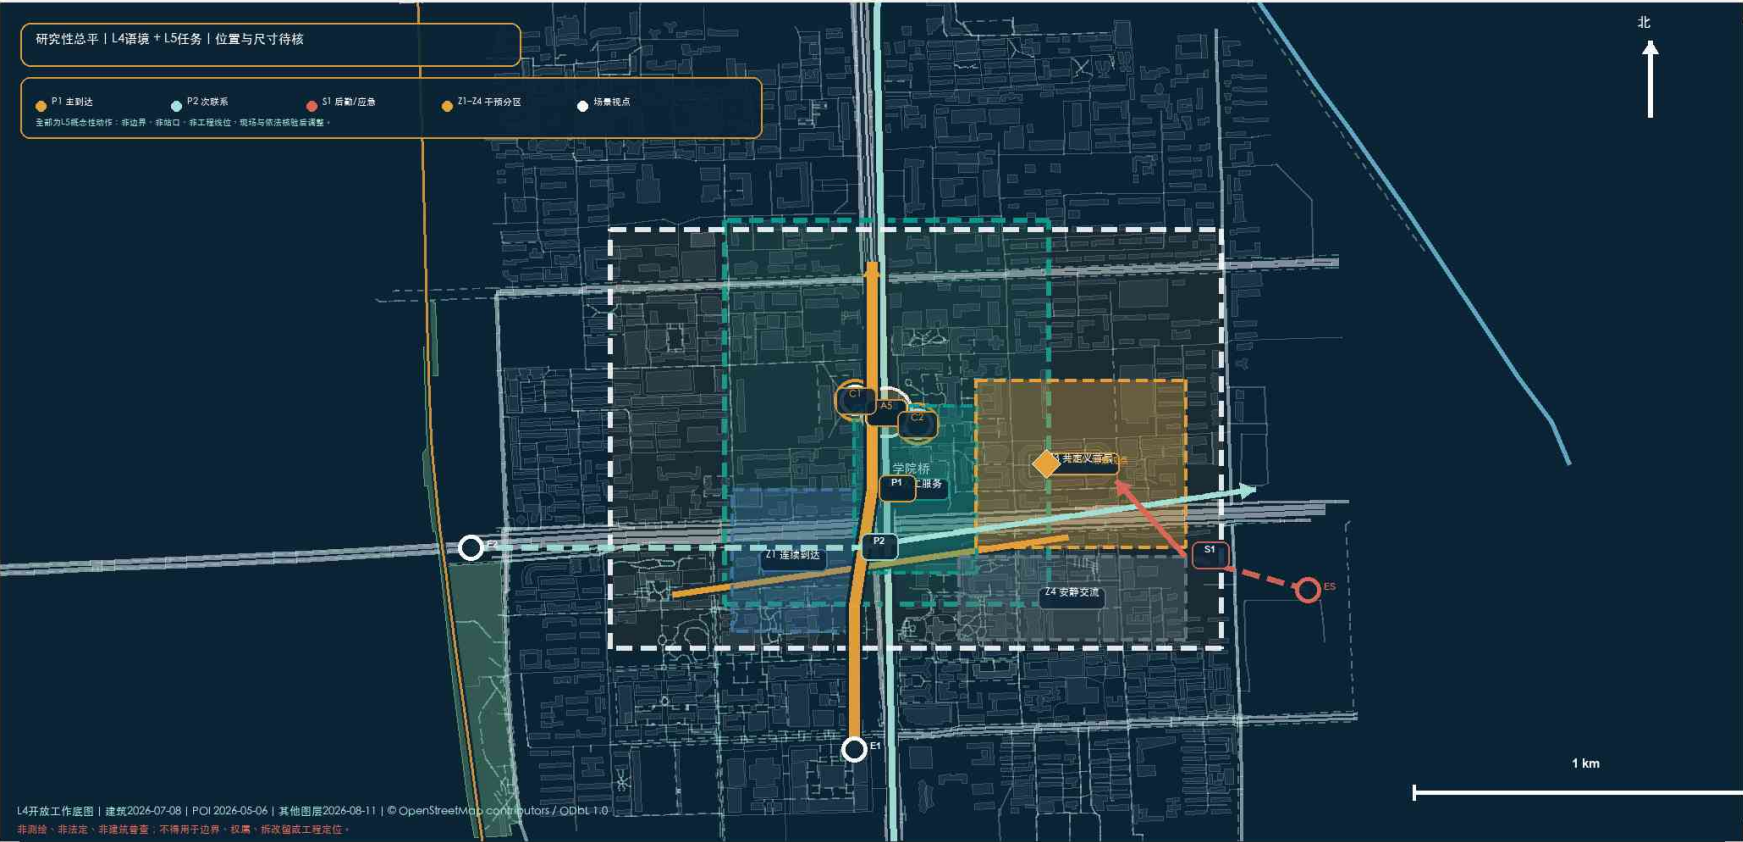

图面对象与审查接口

工作窗	KEY-002
核查锚点	AN-005
剖切线	SEC-AI-AA / SEC-AI-BB
首期组件	DC-AI-001 / DC-AI-002
总平动作	E1/E2/ES + P1/P2/S1 + Z1-Z4 + VIEW

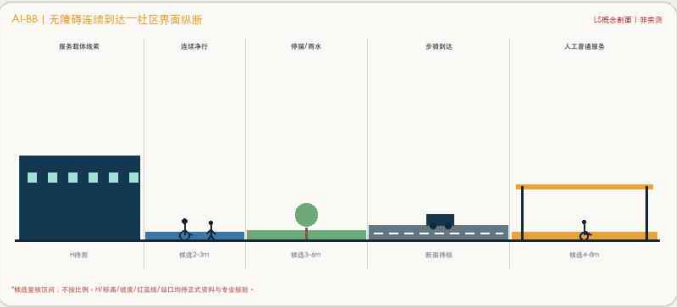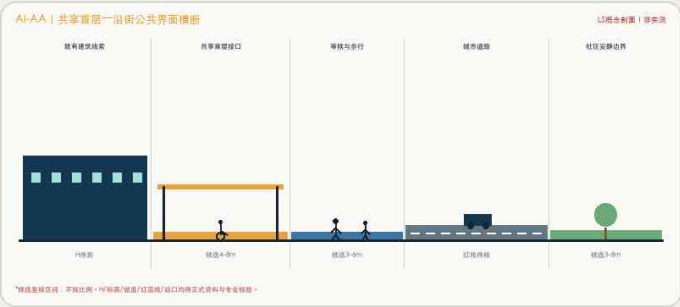

空间一运营一退出闭环




G0至G6逐级留痕：场地、权利、公众、风险、成本、采购或退出任一条件未闭环即保持BLOCK。

C3 / KEY-AREA PLAN-SECTION-OPERATION



大钟寺 · 站城首用转化接口

围绕具名大钟寺站点外部地面界面、需求服务、京张主轴与转河方向组织连续到达，不预设具体站口或地下连通。

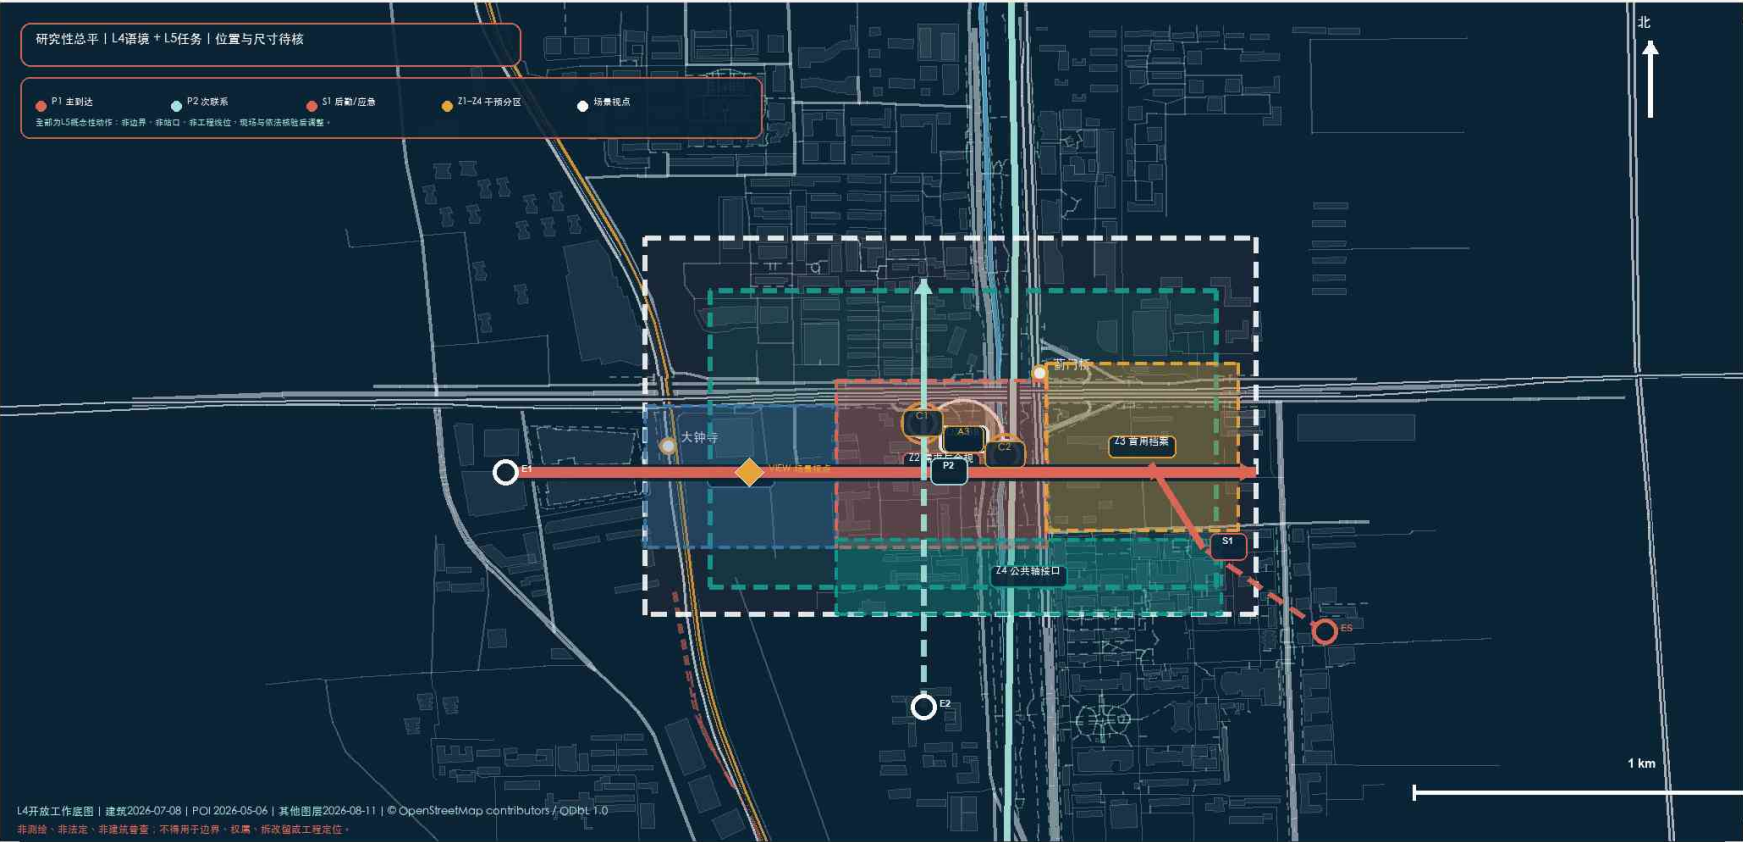

图面对象与审查接口

工作图	KEY-003
核查锚点	AN-003
剖切线	SEC-DZS-AA / SEC-DZS-BB
首期组件	DC-DZS-001 / DC-DZS-002
总平动作	E1/E2/ES + P1/P2/S1 + Z1-Z4 + VIEW

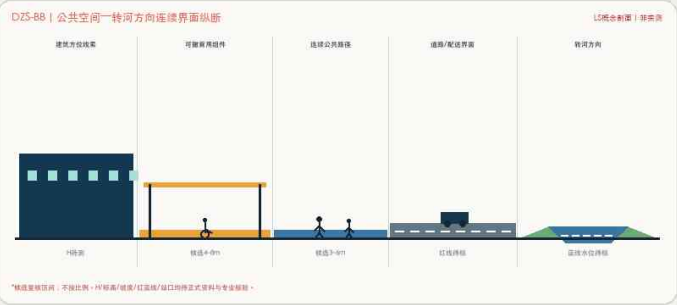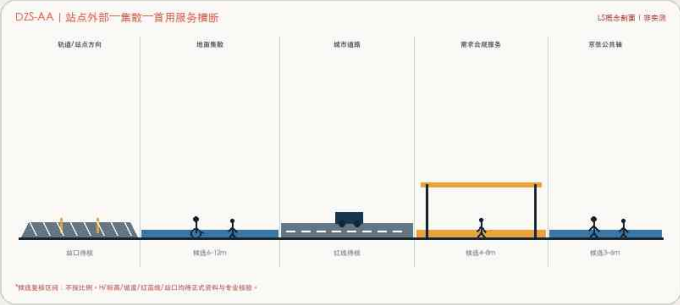

空间一运营一退出闭环




G0至G6逐级留痕：场地、权利、公众、风险、成本、采购或退出任一条件未闭环即保持BLOCK。

S01 / SIX CUT-LINES AND VARIABLE INTERFACES

三处重点区域：六条剖切线的总平定位与场地概念剖面

AA/BB线位为L5研究索引；剖面以候选宽度复核、人体尺度和界面关系表达，不表示现状测量、法定红蓝线、建筑高度、标高、站口或工程尺寸。

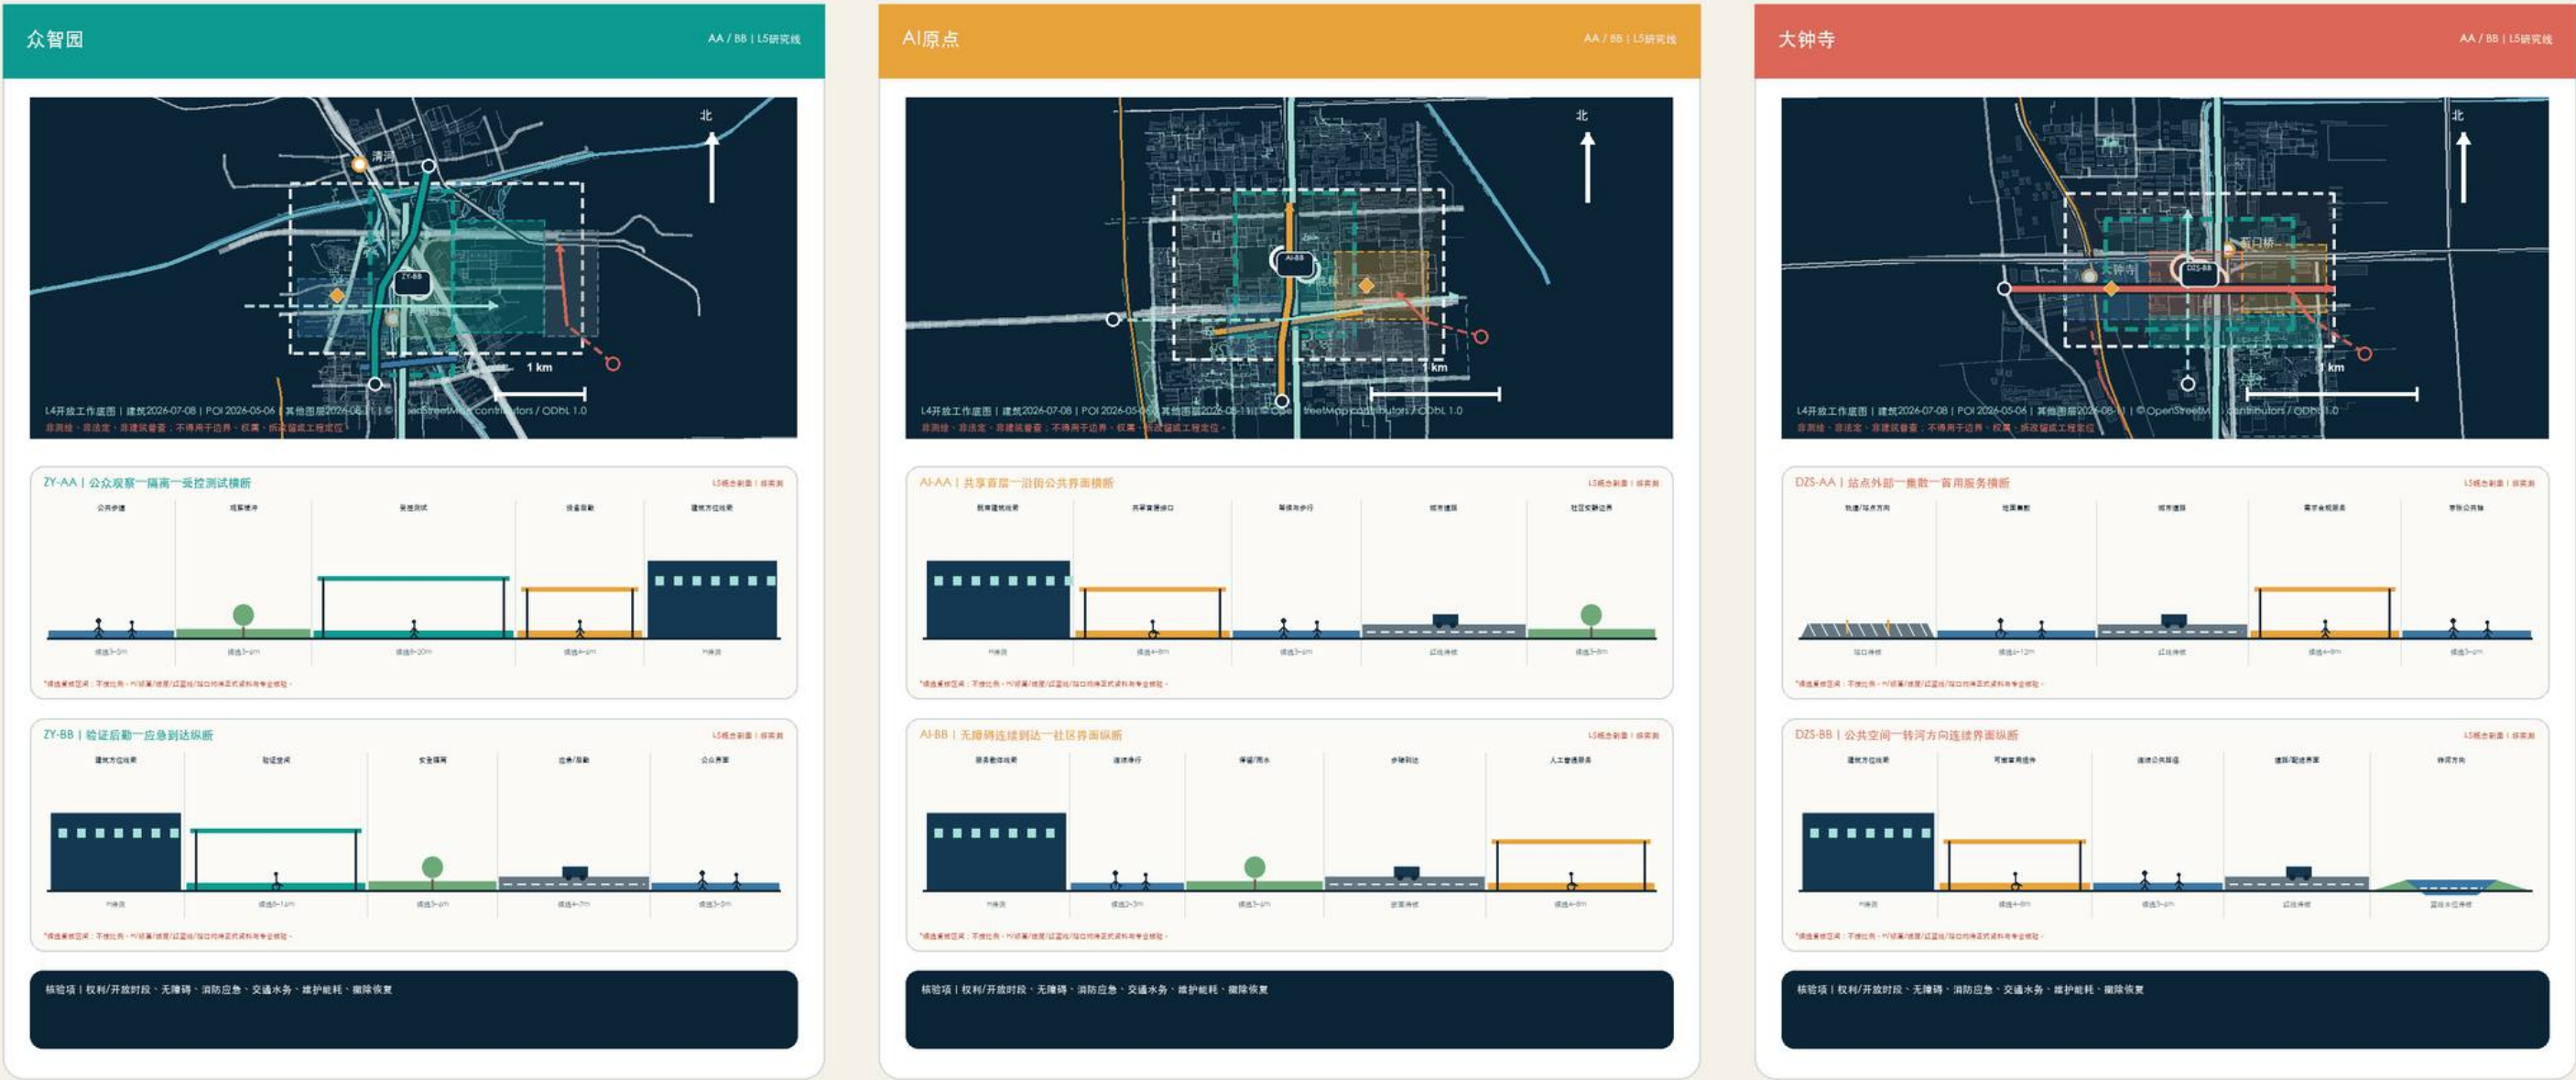

E01 / FOUR VERIFIABLE LOOPS

空间—AI—实施—公共价值：可核验闭环

以下均为提交包、契约和核查任务的完整度计数；不代表现场绩效、法定指标、审批或资金落实。

01 空间证据

1 + 3 + 3

一轴 / 三廊 / 三研究窗

9 + 8

现场核查分段 / 锚点

6 + 6

变量剖面 / 可逆组件

L5 临时工作几何：正式边界、权利和现状待核。

02 AI治理

12 / 12

双独立门覆盖

12 / 12

人工最终复核覆盖

72 / 1,498

合成分支 / 通过断言

60个缺陷分支失败关闭；合成PASS不证明真实有效。

03 实施接续

3

全生命周期项目台账

G0—G6

证据至退出七级门控

8 + 10

核查接续项 / 成本取证项

角色占位—依法任命—书面接收；未取证金额不入总额。

04 公共价值

12 / 12

普通服务等价覆盖

12 / 12

退出恢复回执覆盖

90 / 180日

上线后复核节点

拒绝AI不加价、不增不合理等待或异地行程；申诉转人工。

空间量纲（分层读取）：官方文字研究尺度约11.4 km² | 三处重点区域任务尺度合计约368.4 ha | L4/L5边界诊断约413 m。

待核：正式边界 | 容积率与高度 | 逐栋现状与权属 | 连续开放长度 | 工程量、价格、预算和责任主体。

D00 / EVIDENCE & BOUNDARY

证据—边界—深度控制图

把已确认事实、工作底图、临时几何和设计建议分开审查。



P0 数据缺口

● 正式矢量边界

● 宗地与权属

● 逐栋测绘/结构/消防

● 道路红线与交通量

● 铁路/轨道保护条件

● 河道蓝线与防洪

● 文保正式坐标

● 市政容量


● 预算采购与五年运营账

AI01 / SERVICE BLUEPRINTS

三个实施准备度 AI 概念原型

每项原型同时交付服务蓝图、空间界面、数据流、责任矩阵以及验收与停止条件。

S01 可信模型/边缘设备测试

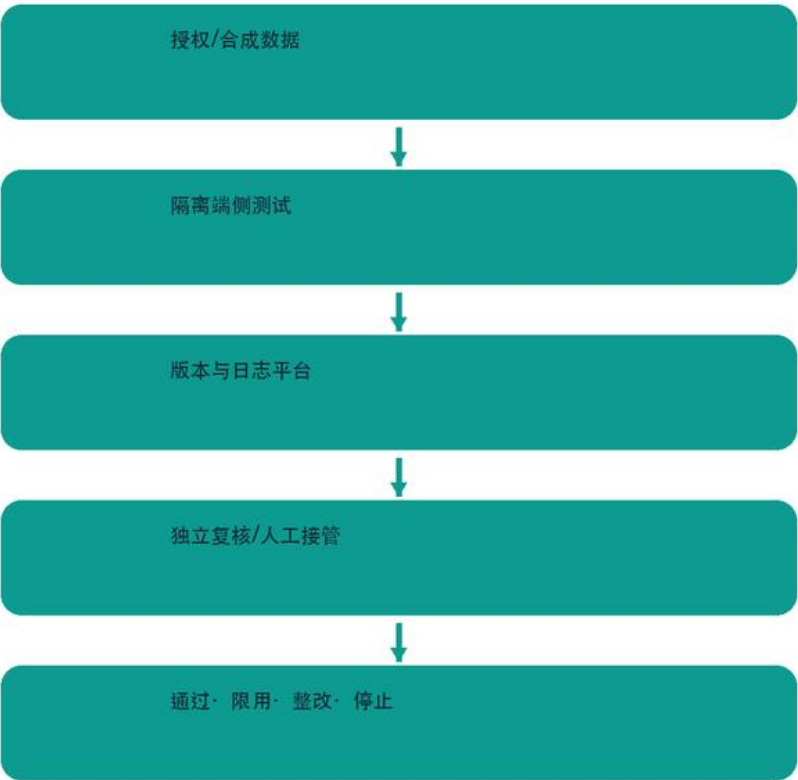


停止：来源不明 / 无人工回退 / 严重事件未闭环 / 权益风险超过收益

S06 包容性公共服务助手



停止：来源不明 / 无人工回退 / 严重事件未闭环 / 权益风险超过收益

S11 首用转化与后评估

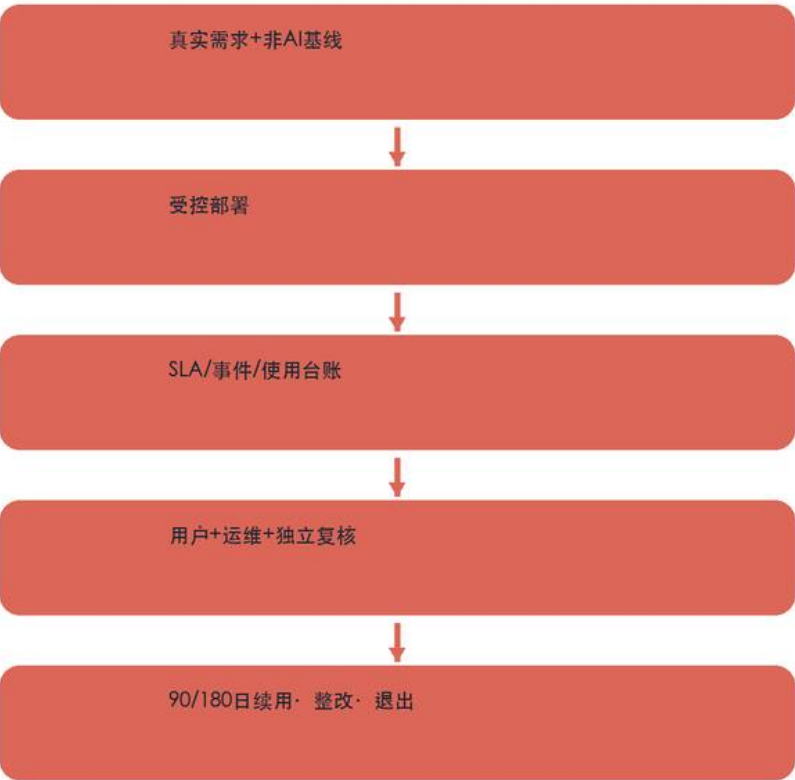

停止：来源不明 / 无人工回退 / 严重事件未闭环 / 权益风险超过收益

G01 / PUBLIC VALUE & GOVERNANCE

公众参与、公共利益与风险治理闭环

公众参与嵌入需求形成、原型观察、运行评价和退出决策全过程。



以上目标值须在完成基线调查、专业复核和责任主体确认后纳入正式绩效文件，不构成政府承诺。

启动控制值建议

需求简报完整率	≥95%
公众意见回应率	≥90%
高风险人工接管覆盖	100%
重大安全/隐私事件	0
无障碍关键阻断关闭	100%
退出完成率	100%

强制暂停/退出触发

- 需求所有者或场地权利不明确
- 数据来源、版本或合法依据不清
- 高风险场景缺人工回退
- 严重安全/隐私/公平问题未闭环
- 全生命周期成本或运维不可承受
- 退出经费、数据删除或替代服务缺失

B01 / IDENTITY & LANDMARK KIT

轨迹织城识别系统与三处可逆地标

以项目状态、证据等级和公共服务为核心，不以企业标志、巨型屏幕或永久构筑物制造地标。

轨迹织城 / RAILWEAVE



五级证据色

L1

L2

L3


L4

L5

触觉编码 | 易读文字 | 低反射材料 | 可替换构件 | 夜间低眩光

01

验证结果廊

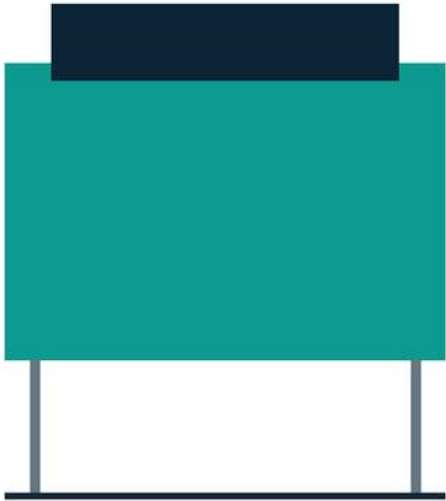


- 通过/限用/整改/停止
- 模型版本与人工复核
- 脱敏摘要

场地、消防、维护、撤展恢复待核

02

协同创新院

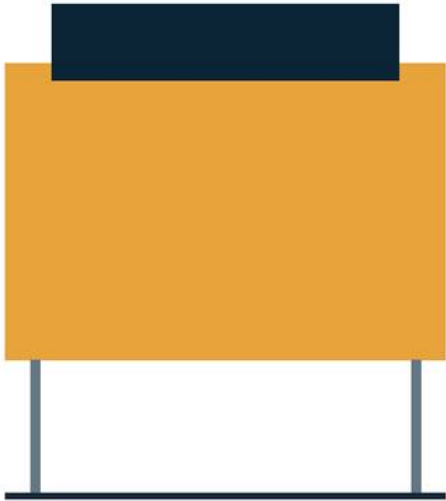


- 纸质/数字需求墙
- 异议与退出记录
- 可移动无障碍组件

场地、消防、维护、撤展恢复待核

03

首用转化门户

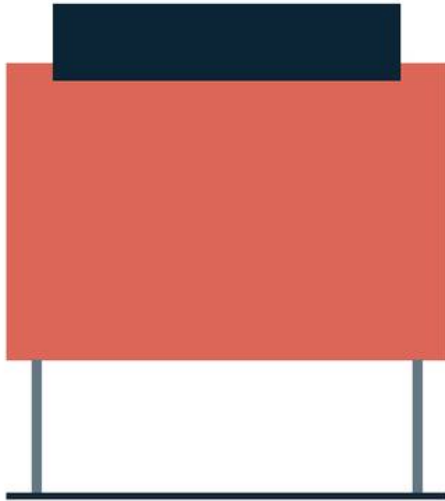

- 需求—验证—采购
- 90/180日后评估
- 铁路里程/项目ID

场地、消防、维护、撤展恢复待核

取得正式资料后统一重算

- 正式边界与控规图纸
- 宗地、权属及逐栋测绘
- 道路、轨道、铁路、水务与文保条件
- 市政容量、采购预算与五年运营账
- 现场无障碍与开放状态调查

统一重算包

- 边界—几何—指标—图纸
- 同一版本、同一日期、同一责任链
- 旧值留痕，不静默覆盖

现场与专业复核

- 开放、无障碍、过街与夜间
- 交通、市政、水务、消防与文保
- 数据安全、采购、保险与审计

转段与退出记录

- 主体、权利与书面责任
- 五年总成本与资金来源
- 验收、整改、暂停与恢复回执

本成果不作为法定规划、工程设计、投资决策、采购结果或审批依据。
